

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
BSS ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE TÁRGYÁBAN
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.

székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 7.

Cgsz.: 01-10-044255

képv.: Rozenberszki Zsolt értékesítési igazgató
(továbbiakban: Szolgáltató)

másrészről:

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cgsz.:01-10-041633

képv.: Száray Loránt mb. vezérigazgató
(továbbiakban: Felhasználó)


k ö z ö t t .

az alulírt helyen és napon, az alábbiak szerint:

1. Felek közötti szerződéses jogviszonyt a 2011. november 15. napján kelt, határozott időre szóló Szolgáltatási Szerződés BSS Alkalmazásslolgáltatás igénybevétele tárgyában-továbbiakban: Szerződés- rendelkezései szabályozzák.
2. Felek a Szerződés 5. pontjának- „A Szerződés időtartama“- 5.1. alpontját az alábbiak szerint módosítják: „ **A Szerződést a Felek határozott időtartamra, azaz 2011. november 15.- 2012. április 13. napjáig kötik meg. A tényleges szolgáltatás megkezdésének határideje: 2012. január 13.**
3. Felek a Szerződés 4.sz mellékletét- Feladat ütemterv- közös megegyezéssel módosítják, melynek eredményeképp a jelen megállapodással módosított ütemterv képezi a Szerződés 4.sz. mellékletét.
4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

Jelen Szerződés- módosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra cégszerűen felhatalmazott képviselőik útján írják alá.


Budapest, 2011. december 22.




Száray Loránt mb.vezérigazgató
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3.


37.



Rozenberszki Zsolt értékesítési ig.
R&R Software Zrt.



ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1		1 FusionR BSS megvalósítási projekt	43 days	Tue 11.11.15	Fri 12.01.13
2	1.1	M0 - Szerződés-kötés; projekt indulása	0 days	Tue 11.11.15	Tue 11.11.15
3	1.2	FusionR BSS demo	1 day	Wed 11.11.16	Wed 11.11.16
4	1.3	Scoping, FS felülvizsgálat, pontosítás	1 day	Fri 11.11.18	Fri 11.11.18
5	1.4	Prototípus kivitelezése	20 days	Mon 11.11.21	Fri 11.12.16
6	1.5	Ütemezett szakértői egyeztetések	20 days	Mon 11.11.21	Fri 11.12.16
7	1.6	Futtató környezet technikai feltételek egyeztetése	1 day	Fri 11.12.02	Fri 11.12.02
8	1.7	Futtató környezet kialakítása (HW, RDBMS; OS; AS; VPN)	10 days	Mon 11.12.05	Fri 11.12.16
9	1.8	M2 - Futtató környezet kész	0 days	Fri 11.12.16	Fri 11.12.16
10	1.9	FusionR BSS telepítése, épségi ellenőrzés	1 day	Tue 11.12.20	Tue 11.12.20
11	1.10	M4 - FusionR BSS telepítve	0 days	Tue 11.12.20	Tue 11.12.20
12	1.11	M3 - Adatminták rendelkezésre állnak	0 days	Tue 11.12.20	Tue 11.12.20
13	1.12	Ütemezett adatátvételi tesztek	5 days	Wed 11.12.21	Wed 11.12.28
14	1.13	Teljes törzsadat mennyiség rendelkezésre áll	0 days	Wed 11.12.28	Wed 11.12.28
15	1.14	Ütemezett adatátvételi és szállítói tesztek a teljes adatkörön	4 days	Thu 11.12.29	Tue 12.01.03
16	1.15	Felhasználói dokumentáció elkészítése	10 days	Tue 11.12.20	Tue 12.01.03
17	1.16	Átadás-átvételi tesztelés, kulcsfelhasználói oktatások	5 days	Wed 12.01.04	Tue 12.01.10
18	1.16.1	Alapfunkciók; felhasználók, menük, jogosultságok adminisztrációja	1 day	Wed 12.01.04	Wed 12.01.04
19	1.16.2	Ügyfél törzsadat kezelés; ajánlati folyamat	1 day	Thu 12.01.05	Thu 12.01.05
20	1.16.3	Tranzakció feldolgozás; számlázás	2 days	Fri 12.01.06	Mon 12.01.09
21	1.16.4	Folyószámla kezelés; betérítés; behajtás; fkv. feladás	1 day	Tue 12.01.10	Tue 12.01.10
22	1.17	M5 - Tesztelés kész; rendszer megfelelt	0 days	Tue 12.01.10	Tue 12.01.10
23	1.18	Felhasználói oktatások (ügyfél törzsadat kezelés; ajánlati folyamat)	1 day	Wed 12.01.11	Wed 12.01.11
24	1.19	Kezdeti éles adatfeltöltés	2 days	Thu 12.01.12	Fri 12.01.13
25	1.20	M6 - Rendszer üzemkész; éles használatbavétel	0 days	Fri 12.01.13	Fri 12.01.13

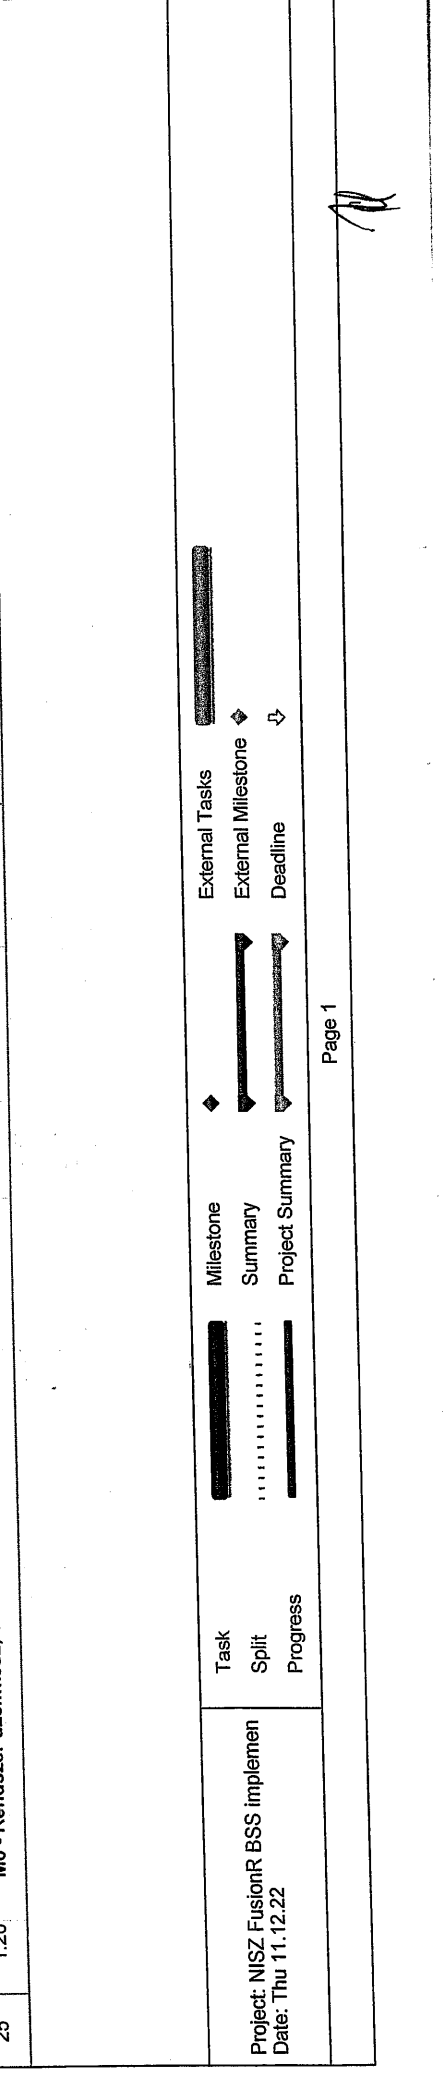

◆ Milestone
▬ Task
▬ Summary
▬ Project Summary
◆ External Tasks
◆ External Milestone
↕ Deadline

Project: NISZ FusionR BSS implement
 Date: Thu 11.12.22

FELJEGYZÉS

Száray Loránt
Mb. Vezérigazgató Úr részére

A NISZ Zrt. 2011. november hó 15.-én Szolgáltatási Szerződést kötött az R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt-vel BSS Alkalmazásslolgáltatás Igénybevétele tárgyában. A projekt megvalósítása a Szolgáltatási Szerződés aláírását követően megkezdődött, 2012. január 04. napjától kezdődik meg a felhasználók oktatása.

Jelen szerződés módosítás főbb tartalmi elemei:

- **módosul a Szerződés időtartama, azaz a rendszerkialakítási időszak lezárásának és a tényleges szolgáltatás megkezdésének határideje 2012. január 01. napja helyett 2012 január 13. napja. Ennek eredményeképp a Szerződés lejártának ideje 2012. március 31. helyett 2012. április 13.**
- **módosul a Szerződés 4.sz. mellékletét képező Feladat ütemterv is a Szerződés időtartamához igazodva.**


A módosítások okai a következők:

- Elmaradás mutatkozik a rendszer környezet felállításában és így a telepítésében is. A két ünnep között fejeződik be.
- A két ünnep között kellene adat élesítést végezni és megtartani az oktatásokat, átvételi teszteket. A kollégák korlátozottan fognak rendelkezésre állni a két ünnep közötti 4 napon. A január eleji időszak kedvezőbb ebből a szempontból is.
- Működési szempontból nem látjuk problémásnak a késést. Számlát leghamarabb januárról kell kiállítani, de ez a hónap végén teljesíthető.
- Vállalkozó elfogadta és támogatja a módosítást.

A projekt során a definiált folyamatok kapcsán először kerül sor határidő változtatásra.


Egyetértése esetén **kérjük Vezérigazgató Urat a Szolgáltatási Szerződés módosításának aláírására.**

Budapest, 2012. december 21.



Korcsolay Zsolt


IT infrastruktúra vezető szakértő



Dénes Tibor

Szenior OSS rendszerszakértő

A szerződés jogi szempontból megfelelő:



Dr. Sandl Judit

Jogi Igazgatóság



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A fejjegyzést elfogadom:

.....
Száray Loránt
Vezérigazgató

Mellékletek:

- NISZ – R&R Zrt. Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosítás
